



Serviços Profissionais ROM

Communications Cloud CPQ Design – Catálogo Unificado

Juliana Brites - Account Partner Director

Odair Civelli Junior - Solution Consulting Director

Nelson Stebulaitis Filho - Services Sales Solution Leader

Agosto 2026



Declaração de Expectativas Futuras



Esta apresentação contém declarações prospectivas sobre, entre outras coisas, análises de tendências e declarações sobre eventos futuros, crescimento esperado e perspectivas da indústria, e nossas estratégias, expectativas ou planos relacionados ao lançamento e aprimoramento de produtos.

A realização ou o sucesso das questões cobertas por tais declarações envolve riscos, incertezas e suposições. Se algum desses riscos se concretizar ou se alguma das suposições se provar incorreta, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos.

Os riscos incluem, mas não se limitam a: nossa capacidade de atender às expectativas dos clientes; incertezas quanto às tecnologias de IA; evolução das regulamentações governamentais; nossa capacidade de introduzir novos serviços; e o ritmo de inovação na computação em nuvem empresarial.



Agenda



01 Nosso Entendimento

02 O Plano para a Transformação

03 Nossa Proposta

04 Time, Plano e Investimento

05 Próximos Passos





ps



Nosso Entendimento



Nosso Entendimento



"Entendemos que a missão principal desta iniciativa é posicionar a Claro Brasil como a operadora digital de vanguarda e líder em eficiência, por meio de um catálogo de produtos unificado e inteligente que elimina a complexidade sistêmica das matrizes legadas e automatiza o fluxo Lead-to-Cash em todas as suas cinco verticais de negócio."



Nosso Entendimento (2)



Esta iniciativa estratégica é impulsionada pelos seguintes pilares:



Redução drástica do TTM

Lançar e atualizar combos e promoções com agilidade competitiva, eliminando a rigidez das matrizes customizadas legadas.



Unificação Multi-LOB

Consolidar Móvel, TV, Banda Larga, Fixo e Aparelhos em um único Shared Catalog aderente ao padrão TM Forum.



Eliminação de Débitos

Substituir código rígido pelo Business Rules Engine declarativo nativo da Communications Cloud.



Nosso Entendimento (3)



Pontos de Risco do Cenário Atual

Silos Organizacionais

Silos entre 5 LOBs impedindo lançamento ágil de combos e sincronização de regras.

Débito Técnico em Código

Matrizes customizadas em código rígido com alta complexidade de manutenção.

Integração com Legados

Coexistência crítica com Billing e OSS/BSS sem arquitetura documentada.

Portfólio & Rede (CFS)

Falta de separação entre comercial e especificações técnicas gerando inconsistências.

Elegibilidade Síncrona

Validação regional sem SLA, gerando alto risco de abandono de carrinho.



Nosso Entendimento



Os Objetivos de Negócios que Vamos Alcançar Juntos

Capacidade Salesforce

EPC com Object Types & Herança

Reduzir TTM de ofertas em 45%

1 catálogo master (vs. múltiplos silos)

Capacidade Salesforce

Modelagem Shared Catalog TM Forum

Atingir 100% das ofertas mapeadas

Unificados em catálogo centralizado

Capacidade Salesforce

Business Rules Engine Declarativo

Eliminar 100% das matrizes custom

Redução de 50% esforço manutenção

Capacidade Salesforce

Advanced CPQ Validation Rules

Reduzir erros no carrinho em 30%

Resposta < 2s | Redução de abandono

Capacidade Salesforce

Order Decomposition Engine (OM)

Transformação automática de combos

Taxa de erro payload 0% | Integridade



ps



O Plano para a Transformação

3



O Plano para a Transformação



Solução Recomendado

Esta arquitetura é projetada para escalabilidade, segurança e agilidade, permitindo crescimento futuro.

CAMADA DE EXPERIÊNCIA

Canais de Venda & Atendimento Claro BR (Físico + Digital)

CAMADA DE PROCESSO

CPQ Engine (Carrinho Inteligente) + Advanced Validation Rules

CAMADA DE DADOS

Enterprise Product Catalog (EPC) — Product2 + Object Types + CFS

CAMADA DE INTELIGÊNCIA

Business Rules Engine (Motor de Regras) — Expression Sets + Tabelas de Decisão

CAMADA DE INTEGRAÇÃO

Middleware / MuleSoft — Barramento Corporativo (API REST Assíncrona)

SISTEMAS EXTERNOS CORE

Billing Core | OSS/BSS (Provisionamento de Rede) | Georreferenciamento (CEP)

O Plano para a Transformação

Decisões Arquitetônicas Chave e Justificativa



1. Shared Catalog TM Forum SID (Duas Camadas)

Justificativa: Desacoplar o portfólio comercial das especificações técnicas de rede é o principal enabler de redução de TTM. O modelo monolítico legado foi descartado por sua rigidez e impossibilidade de evolução sem impacto em Billing e OSS/BSS.

2. Motor de Regras Declarativo substituindo Matrizes Customizadas

Justificativa: Matrizes em código Apex geram débito técnico permanente e dependência de TI para qualquer alteração tarifária. O Motor de Regras entrega autonomia ao Negócio e elimina deploys para atualizações de preço. Alternativa descartada: manutenção de código customizado Apex.

Uso de IA



Condições de Engajamento de IA e Impacto

O escopo desta PoC prevê a alocação de **2 Arquitetos por 3 meses/12 semanas**. Caso a Claro Brasil autorize formalmente a aplicação e uso de ferramentas de IA, o prazo e esforço serão reduzidos, mantendo-se a mesma qualidade e entregáveis.



Recursos/Profissionais
Mesma quantidade



Esforço | Preço
Redução de 33%



Novo Prazo (com IA)
8 Semanas

PREMISSA

A redução do prazo está condicionada ao consentimento explícito da Claro Brasil através de Cláusula de IA específica. Na ausência deste, o prazo inicial de 3 meses será mantido.



ps



Nossa Proposta



Nossa Proposta (1)

Resumo do Escopo do Projeto



Iniciativa: Design de Catálogo Unificado e Estrutura de CPQ – Communications Cloud

Duração: 2-3 meses (8-12 semanas) *uso de IA | **Modelo:** Preço Fixo com pagamento por entregáveis.

Visão Geral do Escopo

Iniciativa de Motor de Regras, design técnico completo, parametrização da PoC funcional e o Knowledge Transfer para as equipes de TI e Negócios da Claro Brasil.

Nota: Não inclui implementação de produção ou customizações em código.

Produtos: Communications Cloud (EPC + OM) · Business Rules Engine

Cobertura do Projeto

- **PoC Funcional:** Demo com modelagem exemplo e configuração de templates.
 - 1 PoC por LOB (Móvel, TV, Banda Larga, Fixo, Aparelhos).
 - Até 100 produtos comerciais (20 por LOB) e 5 promoções.
- **Blueprint:** Diagrama da conexão de planos e serviços.
- **Recomendações:** Elegibilidade, compatibilidade e preço.

* Condição de uso de IA descrita no slide de Cronograma (slide 19)

Nossa Proposta (2)



O Que Vamos Entregar e O Que Não Está Incluído

Atividades por Fase

F1 – Imersão: workshops com TI e Negócios, mapeamento de requisitos, detalhamento funcional das ofertas vigentes por LOB

F2 – Modelagem: design EPC (Object Types, CFS, atributos, cardinalidade), modelagem Motor de Regras (Expression Sets, tabelas de decisão), desenho regras CPQ (elegibilidade CEP, compatibilidade)

F3 – PoC Build: configuração de 1 oferta real por LOB em Sandbox (prateleira + carrinho + decomposição OM)

F4 – Knowledge Transfer: workshops técnicos e de negócios, demonstração da PoC, entrega do Relatório Final

Entregáveis

 **Documentação dos Workshops de Discovery:**
detalhamento funcional das ofertas/produtos existentes avaliadas.

 **Product Model Blueprint (PMB):**
Diagrama visual completo da árvore de produtos – planos, serviços e descontos no Salesforce EPC. Especificação de elegibilidade, compatibilidade e precificação via Motor de Regras

 **Sandbox Configurada (PoC Funcional):**
1 oferta por LOB com carrinho CPQ, validações e payloads de decomposição OM funcionais

 **Relatório Final + Gravações:**
entrega completa do projeto e materiais de workshop de KT

Nossa Proposta (3)

O Que Vamos Entregar e O Que Não Está Incluído



✓ Dentro do Escopo

- **Modelagem EPC Shared Catalog:** até 100 produtos comerciais (20/LOB) em duas camadas
- **Bundles e Promoções:** até 5 itens (Fidelidade, Node, Dia das Mães)
- **Templates de produto:** definição de melhor product template (Object Type/Specification)
- **Atributos e Cardinalidade:** mapear características (ex: velocidade, franquia)
- **Motor de Regras:** Expression Sets e Tabelas de Decisão
- **Regras CPQ:** legibilidade por CEP e Compatibilidade tecnológica
- **Decomposição (OM):** payloads CFS para Billing e OSS/BSS
- **PoC funcional:** 1 oferta por LOB em Sandbox
- **Knowledge Transfer:** workshops para TI e Negócios
- **Blueprints:** Product Model Blueprint (PMB)

✗ Fora do Escopo

- Implementação em produção (go-live)
- Redesenho do fluxo de orquestração pós-decomposição OM
- Customizações em código Apex / hooks em métodos nativos
- Saneamento e carga massiva de dados históricos
- AMS (Application Managed Services) pós-projeto
- Integração de canais de venda adicionais
- PoC da modelagem: customizações no CPQ nativo ou legadas

Nossa Proposta (4)

O Que Vamos Entregar e O Que Não Está Incluído



Requisitos (Dependências Claro)

- Sandbox funcional configurada disponibilizada pela Claro antes do início da Fase 3 (PoC Build) – pré-requisito inegociável.
- Documentação técnica (Swagger/OpenAPI/WSDL) das APIs de Billing, OSS/BSS e Georreferenciamento entregue no início da Fase 1.
- Definição formal dos Product Owners com autonomia de aprovação para cada LOB (Móvel, TV, Banda Larga, Fixo, Aparelhos).
- Disponibilização de amostras das planilhas/matrizes de elegibilidade e precificação vigentes para mapeamento Motor de Regras.
- Participação ativa de analistas de TI e Negócios nos workshops de Imersão e KT.



Pressupostos e Premissas

- O volume total de ofertas avaliadas não excederá 100 itens complexos (até 20 por LOB).
- A modelagem proposta baseada em capacidades nativas declarativas eliminará a necessidade de customizações em código.
- O barramento corporativo possui estabilidade e capacidade técnica para receber mensagens assíncronas de OM.
- O cronograma de 2-3 meses é orientado a entregáveis – extensões dependem de aprovação formal.
- As regras de precificação vigentes serão fornecidas em formato legível no início da Fase 2.
- Documentação de Billing/OSS/BSS não fornecida até o início da Imersão é risco de extensão de escopo.



Time, Plano e Investimento



Papéis e Responsabilidades

Atividade / Entregável	Salesforce Leads	Claro Leads
Definição de Requisitos Funcionais (por LOB)	Facilita & Documenta	Fornece Especialistas & Aprova
Design do Catálogo EPC (Object Types, CFS)	Projeta & Configura	Valida & Fornece Feedback
Parametrização do Motor de Regras	Projeta & Configura	Fornece Dados de Preços & Aprova
Configuração da PoC em Sandbox	Constrói & Testa	Executa UAT & Assina Aceite

Participação requerida da Claro

O sucesso da PoC depende da disponibilidade dos seguintes perfis da Claro:

- Arquiteto de Soluções ou Referência Técnica
- Product Owner ou responsável pelo escopo funcional
- Ponto focal para decisões e acesso aos ambientes necessários

* O não cumprimento pode impactar prazo e entregáveis.

Plano Estratégico



As 12 semanas de engajamento estão divididas em quatro fases estratégicas:*

Fase 1: Imersão e Discovery

Atividades: Desdobramento dos requisitos do Big Rock de ofertas e entendimento dos produtos atuais (com TI e Negócios).

Entrega: Detalhamento funcional das ofertas/produtos existentes avaliadas.

Fase 2: Modelagem

Atividades: Desenhar a modelagem de produtos conforme escopo: Bundles, Ofertas, Atributos e regras de negócio.

Entrega: Product Model Blueprint (PMB).

Fase 3: Configuração e Build (PoC)

Atividades: Configuração de ofertas e testes em CPQ Nativo.


- **Escopo:** Prateleira, Carrinho e Decomposição.
- **Entrega:** Sandbox configurado.
- **Pré-requisito:** Sandbox funcional pela Claro.

Fase 4: Transferência de Conhecimento

Atividades: Workshops para TI e Negócios apresentando o modelo e a PoC funcional.

Entrega: Relatório final e PoC funcional validada.

Plano de Alto Nível

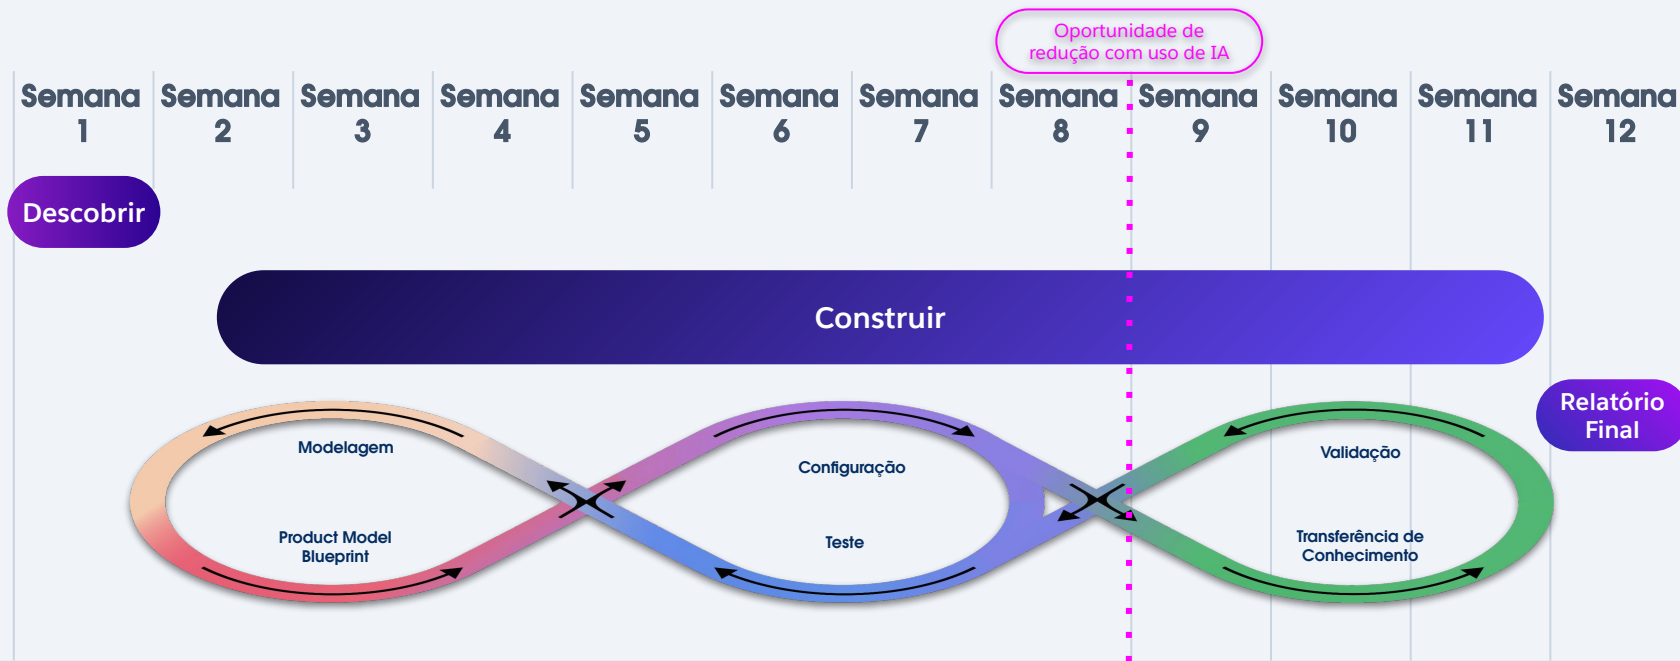

Resumo Estratégico: Este cronograma de 8 semanas prioriza a agilidade. Iniciamos com uma imersão de 2 semanas em design, seguida por 3 semanas intensas de desenvolvimento paralelo, garantindo que o UAT e o refinamento final ocorram com tempo hábil para um Go-Live seguro e suporte assistido (Hypercare) na última quinzena.

Investimento



Descrição	Estimativa
Honorários Estimados de PS Salesforce	12 Semanas R\$ 1.032.770,47 (com impostos)
Com aprovação de cláusula e uso de IA Oportunidade de eficiência operacional	08 Semanas R\$ 688.514,33 (com impostos)



Detalhes & Condições do ROM

- **Estimativa Não Vinculativa:** Os valores fornecidos são apenas para fins informativos. Preços finais em SOW formal.
- **Validade:** Este ROM é válido por 30 dias a partir da data de entrega.
- **Modelo:** Engajamento Tempo & Materiais (T&M) com trabalho prioritariamente remoto.
- **T&E:** Despesas de viagem não incluídas; a definir conforme necessidade on-site.

Próximos Passos



1. Revisão e Alinhamento

Atividade:

Revisar escopo, abordagem e investimento.

Resultado:

Acordo mútuo para prosseguir.

2. Finalização SOW

Atividade:

Refinar detalhes e desenvolver a Declaração de Trabalho.

Resultado:

Um SOW assinado.

3. Início do Projeto

Atividade:

Início formal com a equipe combinada.

Resultado:

A jornada de transformação começa.

Obrigado

